

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme an Anlagen vom Typ

(Aqualift F/XL, Pumpstation Aquapump Medium,
Pumpstation Aquapump XL 230V/400V, Ecolift XL zur freien Aufstellung und im
Schachtmodul)

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine zügige und problemlose Abwicklung der Inbetriebnahme zu gewährleisten, bitten wir Sie zu
überprüfen, ob alle Vorbedingungen für eine reibungslose Inbetriebnahme erfüllt sind:

**Um unseren Servicetechniker optimal auf den Einsatz vorzubereiten und um die Situation vor Ort besser
einschätzen zu können, bitten wir Sie, uns Fotos der Einbausituation von vor Ort zu senden.**

Anforderungen erfüllt:
JA

1. Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner für die Einweisung ist mit vor Ort
- Freie Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät ist gewährleistet
- Anlagengrundkörper ist nach Herstellervorgaben (Betriebsanleitung) verbaut
- Wasserversorgung zur Befüllung der Anlage für den Funktionstest bei der
Inbetriebnahme muss vorhanden sein

- (1) Abwasserabfluss ist angeschlossen
- (2) Lüftungsleitung (DN 70) der Hebeanlage ist angeschlossen
- (3) Druckleitung vollständig installiert
- (4) Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden
- (5) Schaltgerät ist an der Wand montiert und elektronische Zuleitung ist mit
vorgeschriebener Absicherung am Schaltgerät angeschlossen

Seite 1 von 3

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung Abteilung KD

Revisionsstand: 1.0
DE

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)

Alexander Kessel
Edgar Thiemt

Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304

Sitz der Gesellschaft
Lenting

USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

- (6) Pumpe(n) sind an der Anlage montiert, durch das Leerrohr geführt und am Schaltgerät elektrisch angeschlossen*

Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert, durch das Leerrohr geführt und am Schaltgerät angeschlossen*

Erforderliche Kabellänge (Länge Kabelleerrohr, Entfernung zum Schaltgerät in Metern)
_____ Meter


*nicht erforderlich bei Zusatzleistung Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten (Art.-Nr. 80220.10; Preis 665,40 EUR netto)

Die Zusatzleistung Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten möchte ich zu folgendem Preis 665,40 EUR netto kostenpflichtig bestellen.

- Kabel wurden bauseits verlängert
- Kabel müssen durch KESSEL verlängert werden

- (7) Kabelleerrohr ist zum Gebäude hin abgedichtet

- (8) Zulaufleitungen müssen gespült sein

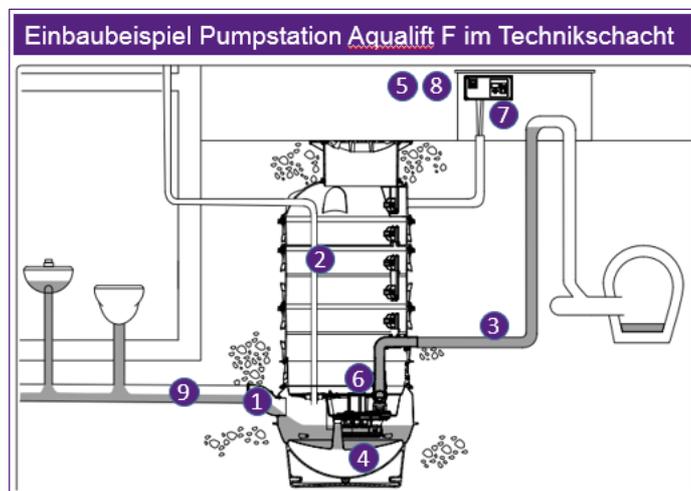

Zusatz bei ATEX Anlagen (Explosionsschutz): Gemäß Richtlinie EN 60079-14 ist für den Potentialausgleich an den Tauchmotorpumpen ein Anschluss von min. 4mm² zu installieren. (KESSEL Betriebs-Wartungsanleitung 010-989; Zusatz für EX-geschützte Ausführung)

Zusatz für Schachtanlagen: Beim Serviceeinsatz in Schachtanlagen ist lt. BGV C5 §34, BGR 236 ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein.

Zusatz für Modem TeleControl: Die Prepaidkarten (ausschließlich Telefonie, keine Datenkarten) müssen vor Inbetriebnahmetermin registriert und funktionsbereit sein.

2. Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einweisung Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für Betreiber optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen. (Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz!)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

3. Hinweise:

Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand gemäß aktuell gültigem Stundensatz verrechnet. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.

Sind ein oder mehrere Punkte der Checkliste nicht erfüllt, kann die Inbetriebnahme abgebrochen und gemäß Pauschale verrechnet werden.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Checkliste vollständig gelesen habe und die hausseitigen Voraussetzungen wie angegeben erfüllt sind.

Datum + Unterschrift + Stempel

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Checkliste zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ausgefüllt und unterschrieben zurück. (Bestellformular unter www.kessel.de/servicebestellung)

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: 08.01.2024

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.1
DE
Seite 3 von 3

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)
Alexander Kessel
Edgar Thiemt
Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304
Sitz der Gesellschaft
Lenting
USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting
Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

www.kessel.de
