

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme an Anlagen vom Typ

(Aqualift F Compact, Aqualift S, Pumpfix F, Staufix FKA und Ecolift zum Einbau in die Bodenplatte sowie freiliegende Installation)

Sehr geehrte Damen und Herren,
um eine zügige und problemlose Abwicklung der Inbetriebnahme zu gewährleisten, bitten wir Sie zu überprüfen, ob alle Vorbedingungen für eine reibungslose Inbetriebnahme erfüllt sind:

Um unseren Servicetechniker optimal auf den Einsatz vorzubereiten und um die Situation vor Ort besser einschätzen zu können, bitten wir Sie, uns Fotos der Einbausituation von vor Ort zu senden.

Anforderungen erfüllt:
JA

1. Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner für die Einweisung muss mit vor Ort sein
- Freie Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Anlagengrundkörper ist nach Herstellervorgaben (Betriebsanleitung) verbaut
Aktuelle Einbautiefe (siehe Abbildung Seite 2)
- Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein
- Wasserversorgung zur Befüllung der Anlage für den Funktionstest bei der Inbetriebnahme muss vorhanden sein

(1) Abwasseranschluss ist angeschlossen

(2) Zulaufleitungen müssen gespült sein

(3) Anlagenbehälter muss sich im gereinigten Zustand befinden

(4) Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen* (gilt nicht für Rückstauverschlüsse)

(5) Druckleitung vollständig installiert* (gilt nicht für Rückstauverschlüsse)

(6) Zugfähiges Kabelleerohr in mind. DN 50 (bei Pumpfix F mind. DN 70) verlegt
Erforderliche Kabellänge (Länge Kabelleerohr, Entfernung zum Schaltgerät in Metern)
Meter

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, beträgt die werkseitige Kabellänge 10 Meter.

- Kabel wurden bauseits verlängert

- Kabel müssen durch KESSEL verlängert werden

(7) Fest installierte Steckdose an der Wand, i. d. R. eine Dose neben dem Schaltgerät max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt (erforderliche Absicherung beachten)

Seite 1 von 2

Ersteller / Erstellt am: KD / 25.10.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.0
DE

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)

Alexander Kessel
Edgar Thiemt

Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair


Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304

Sitz der Gesellschaft
Lenting


USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

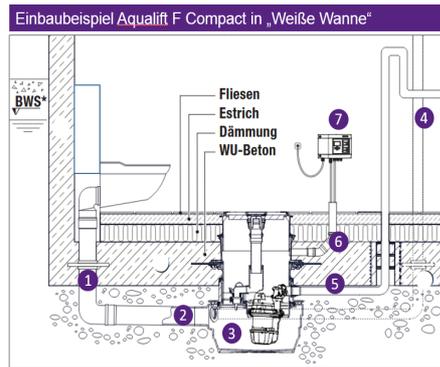

Es ist zu beachten, dass die Anlage aus Wartungsgründen keinesfalls tiefer als 80cm unter Fertigfußboden liegen darf. Desweiteren empfehlen wir für den Verbau in der Bodenplatte eine maximale Einbautiefe von 650 mm bis zur Oberkante der Funktions- bzw. Technikplatte bzw. -einheit (z.B. Pumpe), siehe auch Abb. 4.



Zusatz für Modem TeleControl: Die Prepaidkarten (ausschließlich Telefonie, keine Datenkarten) müssen vor Inbetriebnahmetermin registriert und funktionsbereit sein.

2. Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Schaltgerät an der Wand montieren (Standort muss vor Ort genau definiert sein, damit es zu keinen Schäden in der Wand während der Installation kommt)
- Elektrokomponenten an der Anlage montieren
- Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen (max. 5m Kabellänge)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben
- Einweisung Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für Betreiber optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen. (Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz!)

3. Hinweise:

Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand gemäß aktuell gültigem Stundensatz verrechnet.

Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.

Sind ein oder mehrere Punkte der Checkliste nicht erfüllt, kann die Inbetriebnahme abgebrochen und gemäß Pauschale verrechnet werden.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Checkliste vollständig gelesen habe und die hausseitigen Voraussetzungen wie angegeben erfüllt sind.

Datum + Unterschrift + Stempel

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Checkliste zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ausgefüllt

und unterschrieben zurück. (Bestellformular unter www.kessel.de/servicebestellung)

Ersteller / Erstellt am: KD / 25.10.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.0
DE

Seite 2 von 2

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)

Alexander Kessel
Edgar Thiemt

Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304

Sitz der Gesellschaft
Lenting

USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

www.kessel.de
